




Etapper för port 74

Etapp 5	Etapp 6	Etapp 7	Etapp 8
1201	1202	1203	1204
1301	1302	1303	1304
1401	1402	1403	1404
1501	1502	1503	1504
1601	1602	1603	1604
1701	1702	1703	1704



Projekt
Brf. Valvet Etapp 5
Utfärdad 2024-11-26
Reviderad 2024-11-29
Ansvarig Oskar Siemaszko

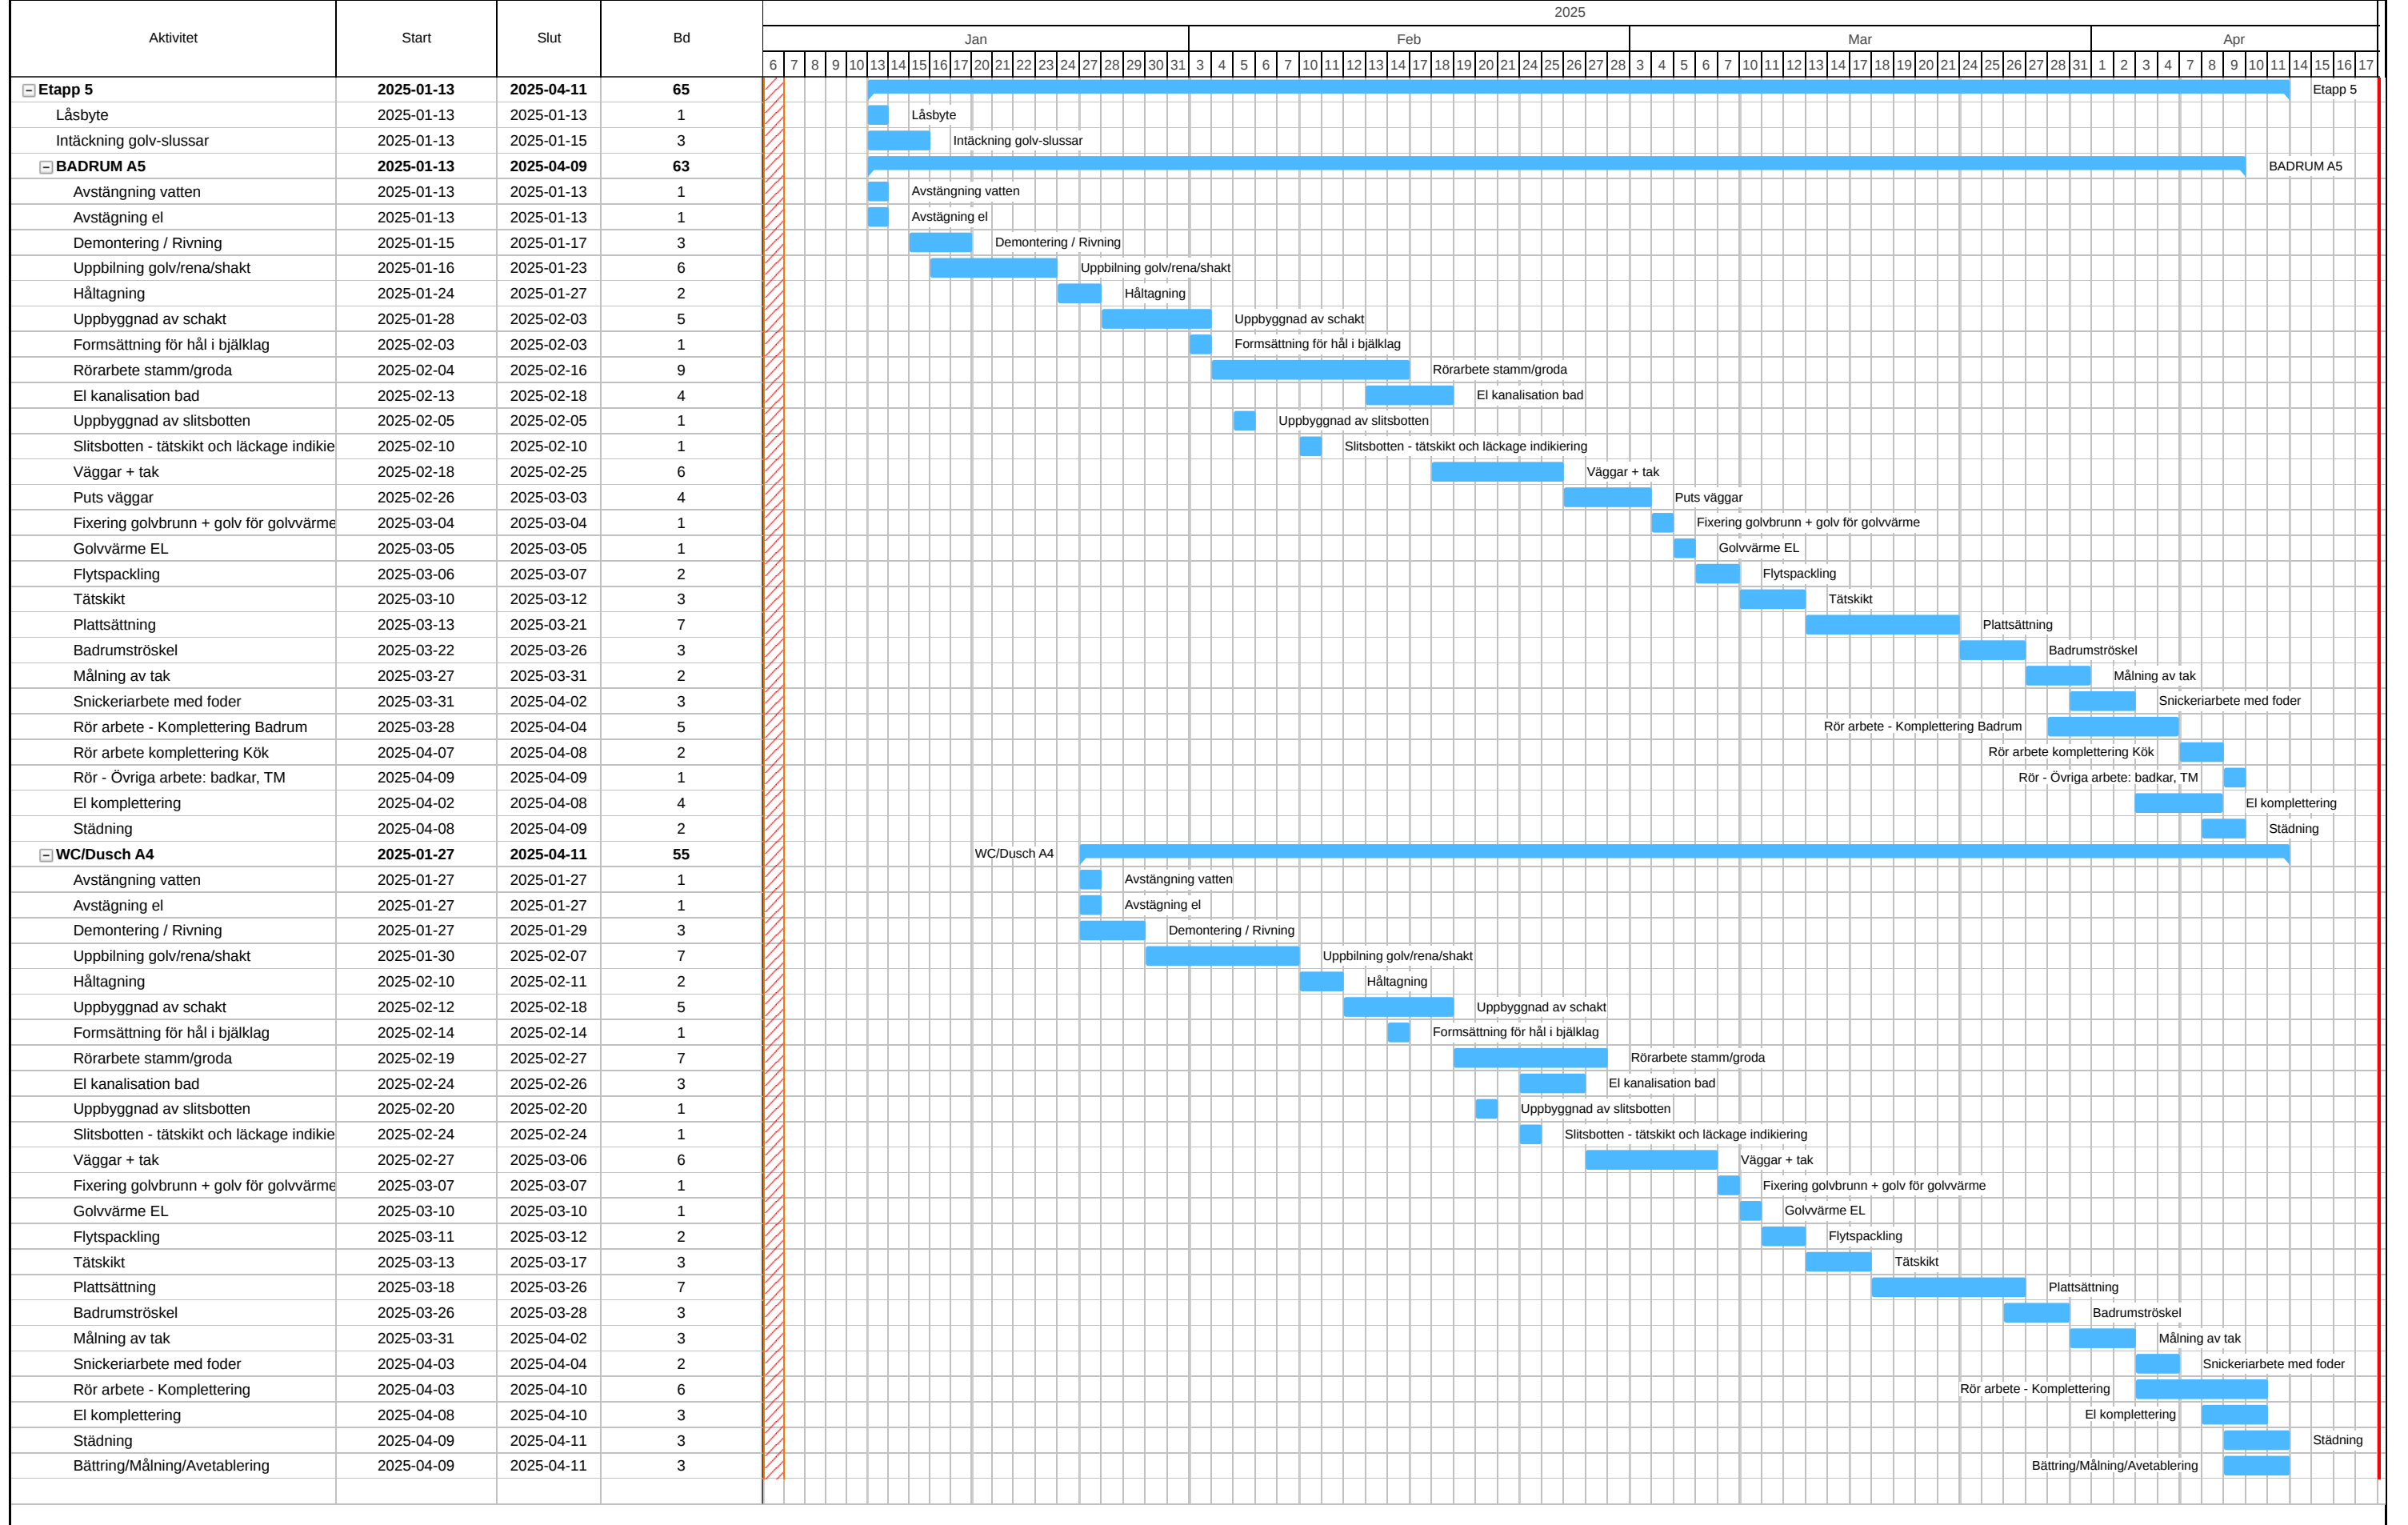



Projekt
Brf. Valvet Etapp 8
Utfärdad 2024-11-28
Reviderad 2024-11-29
Ansvarig Oskar Siemaszko

Aktivitet	Start	Slut	Bd	2025																																																																														
				Mar							Apr							Maj							Jun																																																									
				3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19
Port 74	2025-03-10	2025-06-19	69	Port 74																																																																														
Etapp 8	2025-03-10	2025-06-19	69	Etapp 8																																																																														
Låsbyte	2025-03-10	2025-03-10	1	Låsbyte																																																																														
Intäckning golv-slussar	2025-03-10	2025-03-12	3	Intäckning golv-slussar																																																																														
WC R2	2025-03-10	2025-05-22	51	WC R2																																																																														
Avstängning vatten	2025-03-10	2025-03-10	1	Avstängning vatten																																																																														
Avstängning el	2025-03-10	2025-03-10	1	Avstängning el																																																																														
Demontering / Rivning	2025-03-10	2025-03-12	3	Demontering / Rivning																																																																														
Uppbilning golv/rena/shakt	2025-03-13	2025-03-21	7	Uppbilning golv/rena/shakt																																																																														
Håltagning	2025-03-24	2025-03-25	2	Håltagning																																																																														
Uppbyggnad av schakt	2025-03-26	2025-04-01	4	Uppbyggnad av schakt																																																																														
Formsättning för hål i bjälklag	2025-03-28	2025-03-28	1	Formsättning för hål i bjälklag																																																																														
Rörarbete stamm/groda	2025-04-02	2025-04-10	7	Rörarbete stamm/groda																																																																														
El kanalisation bad	2025-04-07	2025-04-09	3	El kanalisation bad																																																																														
Uppbyggnad av slitsbotten	2025-04-03	2025-04-03	1	Uppbyggnad av slitsbotten																																																																														
Slitsbotten - tätskikt och läckage indikering	2025-04-07	2025-04-07	1	Slitsbotten - tätskikt och läckage indikering																																																																														
Väggar + tak	2025-04-10	2025-04-17	6	Väggar + tak																																																																														
Fixering golvbrunn + golv för golvvärme	2025-04-18	2025-04-22	1	Fixering golvbrunn + golv för golvvärme																																																																														
Golvvärme EL	2025-04-21	2025-04-22	1	Golvvärme EL																																																																														
Flytspackling	2025-04-22	2025-04-23	2	Flytspackling																																																																														
Tätskikt	2025-04-24	2025-04-28	3	Tätskikt																																																																														
Plattsättning	2025-04-29	2025-05-08	7	Plattsättning																																																																														
Badrumströskel	2025-05-07	2025-05-09	3	Badrumströskel																																																																														
Målning av tak	2025-05-12	2025-05-14	3	Målning av tak																																																																														
Snickeriarbete med foder	2025-05-15	2025-05-16	2	Snickeriarbete med foder																																																																														
Rör arbete - Komplettering	2025-05-15	2025-05-22	6	Rör arbete - Komplettering																																																																														
El komplettering	2025-05-20	2025-05-22	3	El komplettering																																																																														
BADRUM A1	2025-03-24	2025-06-19	59	BADRUM A1																																																																														
Avstängning vatten	2025-03-24	2025-03-24	1	Avstängning vatten																																																																														
Avstängning el	2025-03-24	2025-03-24	1	Avstängning el																																																																														
Demontering / Rivning	2025-03-26	2025-03-28	3	Demontering / Rivning																																																																														
Uppbilning golv/rena/shakt	2025-03-27	2025-04-03	5	Uppbilning golv/rena/shakt																																																																														
Håltagning	2025-04-04	2025-04-07	2	Håltagning																																																																														
Uppbyggnad av schakt	2025-04-08	2025-04-14	5	Uppbyggnad av schakt																																																																														
Formsättning för hål i bjälklag	2025-04-14	2025-04-14	1	Formsättning för hål i bjälklag																																																																														
Rörarbete stamm/groda	2025-04-15	2025-04-29	9	Rörarbete stamm/groda																																																																														
El kanalisation bad	2025-04-24	2025-04-29	4	El kanalisation bad																																																																														
Uppbyggnad av slitsbotten	2025-04-16	2025-04-16	1	Uppbyggnad av slitsbotten																																																																														
Slitsbotten - tätskikt och läckage indikering	2025-04-21	2025-04-22	1	Slitsbotten - tätskikt och läckage indikering																																																																														
Väggar + tak	2025-04-29	2025-05-07	6	Väggar + tak																																																																														
Puts väggar	2025-05-07	2025-05-12	4	Puts väggar																																																																														
Fixering golvbrunn + golv för golvvärme	2025-05-13	2025-05-13	1	Fixering golvbrunn + golv för golvvärme																																																																														
Golvvärme EL	2025-05-14	2025-05-14	1	Golvvärme EL																																																																														
Flytspackling	2025-05-15	2025-05-16	2	Flytspackling																																																																														
Tätskikt	2025-05-19	2025-05-21	3	Tätskikt																																																																														
Plattsättning	2025-05-22	2025-06-02	7	Plattsättning																																																																														
Badrumströskel	2025-06-02	2025-06-04	3	Badrumströskel																																																																														
Målning av tak	2025-06-05	2025-06-10	3	Målning av tak																																																																														
Snickeriarbete med foder	2025-06-09	2025-06-11	3	Snickeriarbete med foder																																																																														
Rör arbete - Komplettering Badrum	2025-06-06	2025-06-16	6	Rör arbete - Komplettering Badrum																																																																														
Rör arbete komplettering Kök	2025-06-16	2025-06-17	2	Rör arbete komplettering Kök																																																																														
Rör - Övriga arbete: badkar, TM	2025-06-18	2025-06-18	1	Rör - Övriga arbete: badkar, TM																																																																														
El komplettering	2025-06-12	2025-06-17	4	El komplettering																																																																														
Städning	2025-06-18	2025-06-19	2	Städning																																																																														
Bättring/Målning/Avetablering	2025-06-13	2025-06-19	5	Bättring/Målning/Avetablering																																																																														
